



รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานเขตหนองจอก

(1 เมษายน - 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)					
ลำดับ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ขอจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นสัดส่วน
1	กำลังดำเนินการ	-	-	-	-
2	แล้วเสร็จ	62	202,535,000	164,222,474.88	81.08 %
	ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)	202,535,000	202,535,000	164,222,474.88	81.08 %

กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)

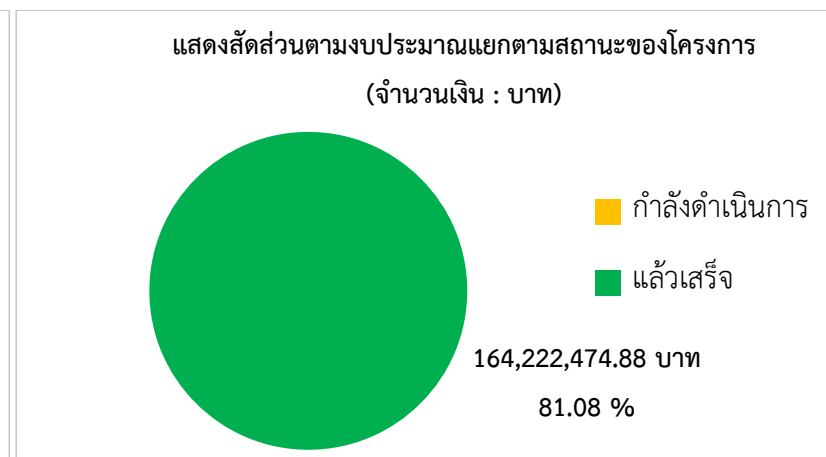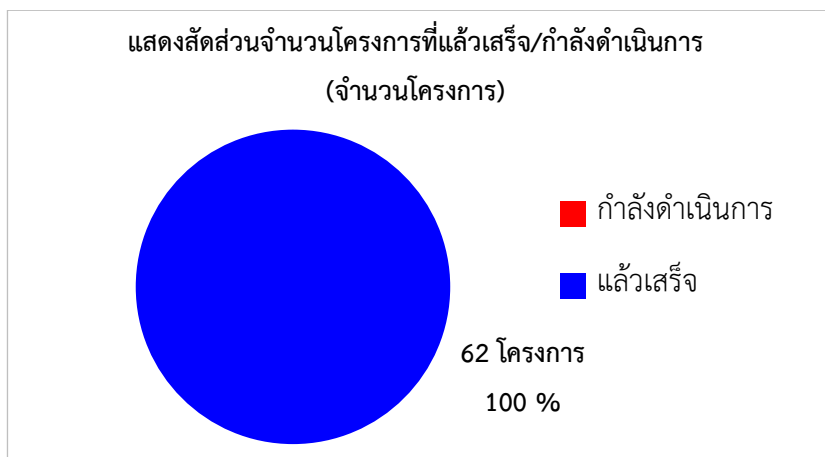

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1.	กิจกรรมการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยจากต้นทาง (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	100,000	100,000
2.	ปรับปรุงโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (ฝ่ายการศึกษา/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	2,391,000	2,222,222
3.	ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าหะยีมิณา (ฝ่ายการศึกษา/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	2,750,000	2,700,000
4.	ปรับปรุงโรงเรียนสามแยกท่าไข่ (ฝ่ายการศึกษา/1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	1,495,000	1,444,540
5.	ปรับปรุงโรงเรียนนิลราษฎร์อุปถัมภ์ (ฝ่ายการศึกษา/1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	2,629,000	2,552,277
6.	ปรับปรุงโรงเรียนลำผักชี (ฝ่ายการศึกษา/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	3,166,000	2,988,000
7.	ปรับปรุงโรงเรียนวัดสามง่าม (ฝ่ายการศึกษา/1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	3,037,000	2,415,000
8.	ปรับปรุงโรงเรียนลำบุหรีพวง (ฝ่ายการศึกษา/1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	1,744,000	1,680,000
9.	ปรับปรุงโรงเรียนวัดแสนเกษม (ฝ่ายการศึกษา/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	1,050,000	1,003,000

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
10.	ปรับปรุงสถานกีฬาชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลนาอิม แขวงคู้ฝิ่งเหนือ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	2,939,000	2,645,400
11.	ปรับปรุงสถานกีฬาชุมชนแผ่นดินทองยะมีอูลุมตะกิน (ลำหินใต้) แขวงโคกแฝด (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ สวัสดิการสังคม/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	1,790,000	1,700,000
12.	ปรับปรุงสถานกีฬาชุมชนแผ่นดินทองนุ้รูลเอียะห์ซ่าน แขวงโคกแฝด (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	1,364,000	1,225,471.30
13.	ปรับปรุงสถานกีฬาชุมชนแผ่นดินทองนุ้รูลลอฮ์ แขวงลำต้อยตั้ง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	2,612,000	2,350,500
14.	ปรับปรุงสถานกีฬาชุมชนแผ่นดินทองฮาซ่านุดดิน แขวงหนองจอก (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	2,612,000	2,400,000
15.	กิจกรรมจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	3,390,600	2,060,104
16.	โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยและสารเสพติด (ฝ่ายปกครอง/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	149,000	149,000

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
17.	ปรับปรุงสุสานกลางมุสลิมประจำกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายปกครอง/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	1,373,000	1,370,000
18.	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) (ฝ่ายปกครอง/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	64,000	64,000
19.	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	119,600	113,600
20.	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	324,600	323,440
21.	ปรับปรุงซอยสังฆสันตีสูข 8 จากถนนสังฆสันตีสูข ถึงสุดทางสาธารณะ แขวงกระทุ่มราย (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	10,577,000	6,800,000
22.	ปรับปรุงซอยอยู่วิทยา 12 จากถนนอยู่วิทยา ถึงจุดที่ปรับปรุงแล้ว แขวงกระทุ่มราย (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	9,508,000	6,960,830
23.	ปรับปรุงซอยเชื่อมสัมพันธ์ 22 จากถนนเชื่อมสัมพันธ์ ถึงถนนเลียบบคลองเจียรดับ แขวงโคกแฝด (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	34,655,000	29,300,000

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
24.	ปรับปรุงถนนแสวนเกษม จากถนนประชาสำราญ ถึงถนนคลองสีบ - คลองสีบสี่ แขวงคลองสีบสอง (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	16,041,000	13,492,700
25.	ปรับปรุงซอยสุวินทวงศ์ 51 จากถนนสุวินทวงศ์ ถึงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองหนึ่ง แขวงกระทู้มราย (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	13,722,000	11,031,560
26.	ปรับปรุงซอยอยู่วิทยา 13 จากถนนอยู่วิทยา ถึงทางเข้าชุมชน แขวงกระทู้มราย (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	8,499,000	6,374,278
27.	ปรับปรุงซอยแยกซอยเลียบบวารี 59 (ทางเข้าหมู่บ้าน ทรัพย์ไพศาล) จากซอยเลียบบวารี 59 ถึงปากซอยหงส์ทอง แขวงโคกแฝด (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	5,445,000	4,189,980
28.	ปรับปรุงซอยสุวินทวงศ์ 98/1 จากถนนสุวินทวงศ์ ถึงสุดทางสาธารณะ แขวงลำด้อยตั้ง (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	2,450,000	1,888,800
29.	ปรับปรุงซอยแยกมิตรไมตรี 6 จากซอยมิตรไมตรี 6 ถึงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองลำเจดีย์เล็ก แขวงหนองจอก (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	5,989,000	4,352,520
30.	ปรับปรุงถนนเลียบบคลองสอง จากซอยสุวินทวงศ์ 98 ถึงโรงเรียนบดินทร์เดชา 4 แขวงลำด้อยตั้ง (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	7,740,000	6,128,480

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
31.	ปรับปรุงซอยสุวินทวงศ์ 19 จากถนนสุวินทวงศ์ ถึงซอยสุวินทวงศ์ 17 แขวงลำผักชี (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	3,231,000	2,506,180
32.	ปรับปรุงซอยสุวินทวงศ์ 98 จากถนนสุวินทวงศ์ ถึงโรงเรียนผลลิ่งรุ่งเรือง แขวงลำต้อยติ่ง (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	13,077,000	11,266,850
33.	ปรับปรุงซอยหมูฮ่อม จากซอยเชื่อมสัมพันธ์ 22 ถึงบ้านเลขที่ 56/22 แขวงโคกแฝด (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	3,059,000	2,317,700
34.	ปรับปรุงซอยเชื่อมสัมพันธ์ 12 จากถนนเชื่อมสัมพันธ์ ถึงสุดทางสาธารณะ แขวงโคกแฝด (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	648,000	522,400
35.	ปรับปรุงซอยบ้านสวนบาร์มี จากซอยเชื่อมสัมพันธ์ 22 ถึงสุดทางสาธารณะ แขวงโคกแฝด (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	4,733,000	3,574,800
36.	ปรับปรุงซอยเลียบบวารี 13 จากถนนเลียบบวารี ถึงสุดทางสาธารณะ แขวงโคกแฝด (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	3,256,000	2,471,600
37.	ปรับปรุงซอยแยกซอยมิตรไมตรี 6 จากซอยมิตรไมตรี 6 ถึงบ้านเลขที่ 35 แขวงหนองจอก (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	1,688,000	1,444,100

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
38.	ปรับปรุงถนนเลียบบคลองลำปลาทิว จากสะพานข้าม คลองสอง ถึงบ้านไม่มีเลขที่ แขวงโคกแฝด (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	868,000	752,180
39.	ปรับปรุงซอยเลียบบวารี 25 (อมรทรัพย์) จากถนนเลียบบวารี ถึงบ้านเลขที่ 71/8 แขวงโคกแฝด (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	2,382,000	1,985,000
40.	ปรับปรุงถนนเลียบบคลองสามง่ามฝั่งเหนือ จากถนน เชื่อมสัมพันธ์ ถึงซอยเลียบบวารี 7 แขวงกระทู้มราย (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	1,447,000	1,216,800
41.	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ สังคม/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	7,140,000	4,631,779.22
42.	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ สังคม/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	500,000	367,100
43.	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการ สภาเด็กและเยาวชนเขต (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	202,000	201,452
44.	ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	20,000	20,000

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
45.	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	3,373,900	3,317,352
46.	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ สังคม/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	853,800	773,728
47.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ สังคม/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	920,700	824,140
48.	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	358,000	334,000
49.	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	200,000	200,000
50.	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	1,134,000	815,411.36

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
51.	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	400,000	399,500
52.	ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู (ฝ่ายการศึกษา/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	30,300	28,925
53.	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญ รุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (ฝ่ายการศึกษา/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	226,000	226,000
54.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานศูนย์ วิชาการเขต (ฝ่ายการศึกษา/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	63,400	63,400
55.	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	244,200	230,680
56.	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	83,400	78,135
57.	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้ (ฝ่ายการศึกษา/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	446,700	440,700

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
58.	ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ (ฝ่ายการศึกษา/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	1,056,000	981,600
59.	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ฝ่ายการศึกษา/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	314,400	205,260
60.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน (ฝ่ายการศึกษา/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	720,000	720,000
61.	ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	50,000	50,000
62.	ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น (ฝ่ายการศึกษา/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	4,336,400	4,004,169

ปัญหาและอุปสรรค..... - ไม่มี -

.....

ข้อเสนอแนะ..... - ไม่มี -

.....
