


รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานเขตบางขุนเทียน

(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)					
ลำดับ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ขอจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นสัดส่วน
1	กำลังดำเนินการ	45	151,927,720	117,547,579	77.37
2	แล้วเสร็จ	19	26,646,100	13,768,283	51.67
	ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)	64	178,573,820	131,315,862	73.54

กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)

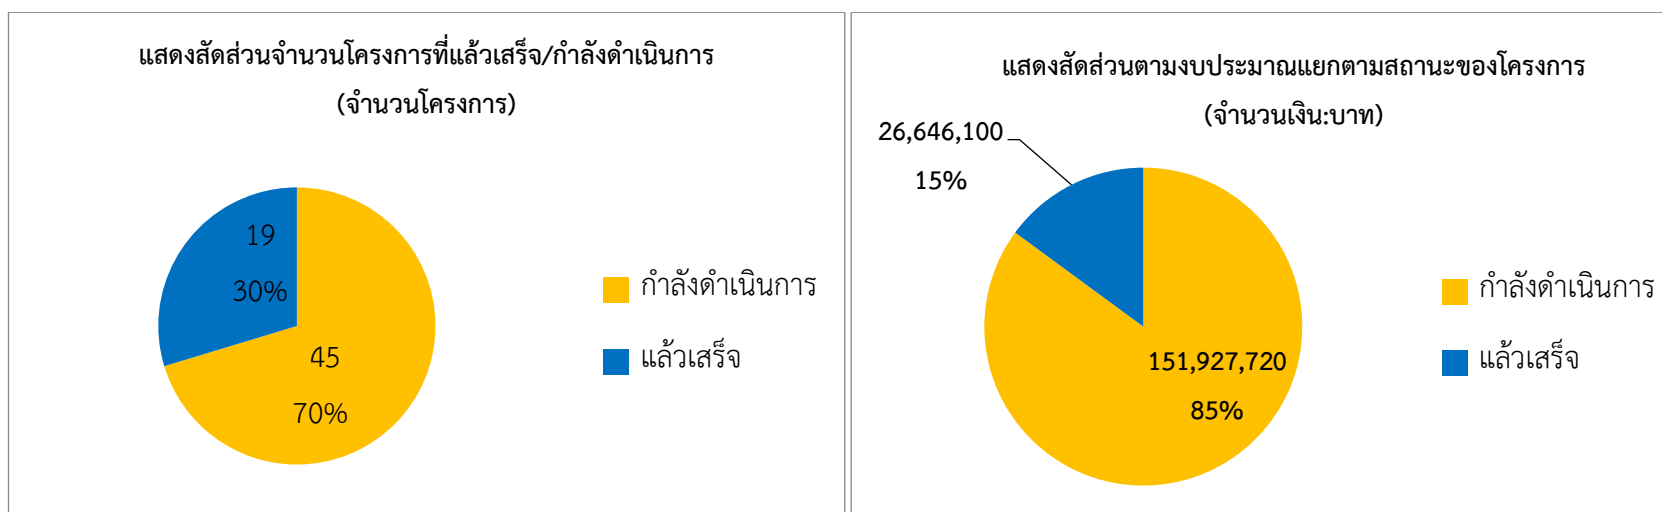

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1	โครงการบูรณาการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตบางขุนเทียน (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	60 %	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
2	โครงการพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	60 %	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
3	โครงการเทศกิจผู้ช่วยจราจร (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50 %	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
4	แผนปฏิบัติการ (Action Plan) จำนวนจุดผิดที่ได้รับการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขต (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	60 %	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
5	แผนการดำเนินการตามเป้าหมายในการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2567 การยกเลิก/ยุบรวมพื้นที่หาบเร่ แผงลอย นอกจุดผ่อนผัน (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100 %	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
6	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	25 %	221,600.00	0.00
7	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	25 %	39,700.00	0.00

8	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	25 %	314,400	0.00
9	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	25 %	180,000	0.00
10	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	25 %	155,200	0.00
11	ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	25 %	158,000	0.00
12	ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	25 %	30,000	0.00
13	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	25 %	8,538,600	0.00
14	การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	25 %	50,000	0.00
15	การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และ หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100 %	226,000	226,000
16	การประชุมครู (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	25 %	45,700	0.00

17	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566)	แล้วเสร็จ	100 %	64,100	64,100
18	โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	60 %	292,000	145,600
19	โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	20 %	93,000	0.00
20	กรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	41 %	159,600	65,520
21	บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการ แก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	0 %	167,120	0.00
22	ปรับปรุงฐานข้อมูลบุตรแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีสัญชาติไทย ที่เกิดในประเทศไทยและมีถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ เขตบางขุนเทียน (ย้ายเข้าทะเบียนบ้าน) (ฝ่ายทะเบียน/ 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	66.67 %	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
23	จัดทำบัตร (สีชมพู)บุตรแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีสัญชาติไทย ที่เกิดในประเทศไทยและมีถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ เขตบางขุนเทียน (ฝ่ายทะเบียน/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	66.67 %	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ

24	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี - กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของสมเด็จพระบรม-ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/ 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	18.6 %	500,000	93,337
25	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 พ.ย.66 – 31 มี.ค.67)	กำลังดำเนินการ	41.9%	1,230,000	516,000
26	ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50.6 %	2,381,600	1,206,784
27	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร - กิจกรรมตามรอยประวัติศาสตร์ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	9.1 %	180,000	16,400
28	ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100 %	20,000	20,000
29	พัฒนาถนนสวยถนนแสมดำ จากถนนพระรามที่ 2 ถึง คลองสนามชัย ความยาว 2.76 กิโลเมตร (ฝ่ายรักษาฯ/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	แล้วเสร็จ	100 %	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
30	นำเข้าข้อมูลการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุดลงในระบบ BMA TAX MAP เพื่อเพิ่มฐานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2568 (ฝ่ายรายได้/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	แล้วเสร็จ	100 %	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ

31	ชุดลอกคลองศรีภูมิ (ฝ่ายรายได้/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	แล้วเสร็จ	100 %	1,587,000	720,000
32	ชุดลอกคลองรางยายเพียร (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	แล้วเสร็จ	100 %	3,903,000	1,260,000
33	ชุดลอกคลองอ้อ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	แล้วเสร็จ	100 %	3,714,000	3,770,000
34	ชุดลอกลำรางหลังโรงเหล็กซอยสมพรเพชรทองคำ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	แล้วเสร็จ	100 %	377,000	1,500,000
35	ชุดลอกคลองชุดใหม่ (ลัดครุถวิล) (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	แล้วเสร็จ	100 %	657,000	354,000
36	ชุดลอกคลองตรง (บางขุนเทียน) (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	แล้วเสร็จ	100 %	2,330,000	870,000
37	ชุดลอกคลองเขมร (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	แล้วเสร็จ	100 %	2,184,000	820,000
38	ชุดลอกคลองวัดท่าข้าม (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	แล้วเสร็จ	100 %	1,214,000	480,000
39	ชุดลอกคลองตาทอด (บางขุนเทียน) (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	แล้วเสร็จ	100 %	241,000	241,000
40	ชุดลอกคลองตาโฉม (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	แล้วเสร็จ	100 %	990,000	413,000
41	ชุดลอกคลองนา (บางขุนเทียน) (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	แล้วเสร็จ	100 %	3,840,000	1,268,183
42	ชุดลอกคลองรางสะแก (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	แล้วเสร็จ	100 %	3,915,000	1,222,000

43	ชุดลอกคลองนายโ้ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	แล้วเสร็จ	100 %	1,384,000	540,000
44	ชุดลอกคลองตาสูก (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	กำลังดำเนินการ	50%	1,427,000	670,000
45	ปรับปรุงซอยเทียนทะเล 19 แยก 1 จากปากซอยถึงสุดทางสาธารณะ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	กำลังดำเนินการ	7%	23,769,000	19,244,150
46	ปรับปรุงซอยสะแกงาม 13 จากซอย สะแกงาม 13 แยก 2 ถึงสุดทางสาธารณะ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	กำลังดำเนินการ	45%	19,488,000	18,575,245
47	ปรับปรุงซอยเทียนทะเล 20 แยก 11 ถึงสุดทางสาธารณะ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	กำลังดำเนินการ	15%	10,381,000	7,254,450
48	ปรับปรุงซอยเทียนทะเล 28 จากถนน บางขุนเทียน – ชายทะเล ถึงสุดทางสาธารณะ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	กำลังดำเนินการ	100%	6,416,200	3,649,702
49	ปรับปรุงซอยแสมดำ 24 จากวัดแสมดำ ถึงคลองแสมดำเหนือ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	กำลังดำเนินการ	5%	1,224,100	7,680,000
50	ปรับปรุงซอยเทียนทะเล 25 จากคลองวัดลูกวัว ถึงคลองขุนราชพินิจใจ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	กำลังดำเนินการ	40%	19,159,000	14,150,000

51	ปรับปรุงซอยสะแกงาม 12จากถนนวงแหวน กาญจนภิเษกถึงสุดทางสาธารณะ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	กำลังดำเนินการ	10%	5,885,000	4,698,000
52	ปรับปรุงซอยบางกระดี่ 10 จากถนนบางกระดี่ ถึงสุดทางสาธารณะ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	กำลังดำเนินการ	5%	4,230,000	3,199,320
53	ปรับปรุงทางเดินริมคลองบางสีบาท และลำรางม่วงสกุล (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	กำลังดำเนินการ	100%	853,000	820,000
54	ปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองลูกวัว (ชุมชนบางเพนียง) (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	กำลังดำเนินการ	15%	736,000	736,000
55	ปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองหัวกระบือ (วัดหัวกระบือ) (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	กำลังดำเนินการ	5%	822,000	818,000
56	ปรับปรุงถนนเลียบบคลองสหกรณ์ สาย 2 (ฝั่งใต้) จากถนนบางขุนเทียน – ชายทะเล ถึงจุดที่ กำหนดให้ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	กำลังดำเนินการ	10%	8,389,000	6,540,000
57	ปรับปรุงซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 (เคหะธนบุรี 1 ส่วน 1) (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	กำลังดำเนินการ	100%	2,175,000	1,399,981
58	ปรับปรุงซอยพระรามที่ 2 ซอย 62 แยก 2 - 6, 2 - 8, 2 - 10 และ 2 - 12 (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	กำลังดำเนินการ	20%	9,349,000	3,695,640

59	ปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองวัดสิงห์ (ชุมชนวัดกำแพง) (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	กำลังดำเนินการ	100%	472,000	472,000
60	ปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองลูกวัว (ชุมชนประชาบำรุง) (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	กำลังดำเนินการ	100%	498,000	498,000
61	ปรับปรุงถนนเชื่อมระหว่าง จ.สมุทรปราการ จากคลองบางกระนง ถึงคลองบางด้วน (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	กำลังดำเนินการ	60%	6,620,000	5,698,350
62	ปรับปรุงทางเท้าซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 จากถนนพระรามที่ 2 ถึงบริเวณปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 7 (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	กำลังดำเนินการ	30%	7,425,500	6,635,100
63	ปรับปรุงซอยนวมัยงามเจริญ 33 จากคลองรางโพธิ์รับ ถึง สุดทางสาธารณะฯ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	กำลังดำเนินการ	10%	8,284,000	7,100,000
64	ปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองรางยายเพียร (โรงเรียนแก้วชำทับอุปลัมภ์) (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	กำลังดำเนินการ	10%	1,970,000	1,970,000

ปัญหาและอุปสรรค.....

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ.....

ไม่มี
