


รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานเขตสายไหม

(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)					
ลำดับ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ขอจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นสัดส่วน
1	กำลังดำเนินการ	51	163,306,950.00	66,944,065.00	96%
2	แล้วเสร็จ	8	6,658,920.00	2,479,936.80	4%
	ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)	59	169,965,870.00	69,424,001.80	100%

กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)

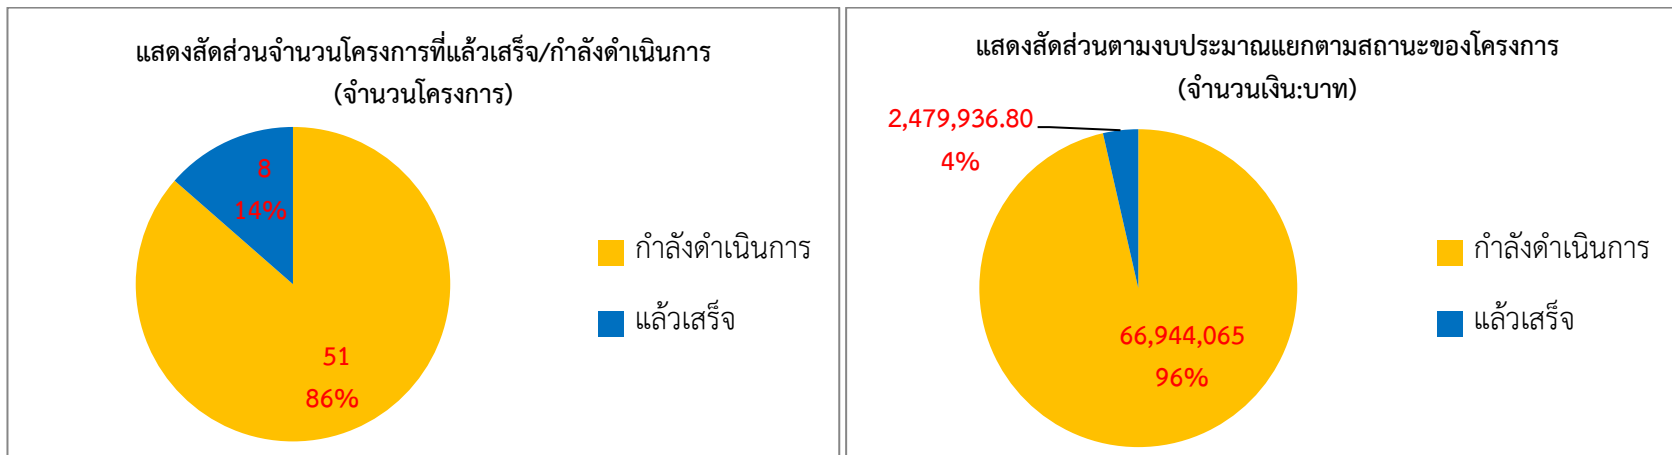

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานสายไหม (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม (ฝ่ายปกครอง)						
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1	โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	61.54	193,600	106,400
2	กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	100	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
3	ความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัล ภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	10	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
4	การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชนผ่าน ระบบ Traffy Fondue	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	100	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
5	พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	40	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

ปัญหาและอุปสรรค.....ไม่

มี

ข้อเสนอแนะ.....

ไม่

มี

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานสายไหม (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม (ฝ่ายเทคนิค)						
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1	โครงการจับมือเตอร์ไฮค์บนทางเท้า	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	11.67	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
2	โครงการสำรวจและประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด อาชญากรรม	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	66.67	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
3	กิจกรรมแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black Spot) ในพื้นที่เขต	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	10	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
4	การจัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	0	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
5	กิจกรรมยกเลิก/ยุบรวมพื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุด ผ่อนผัน	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	แล้วเสร็จ	100	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

ปัญหาและอุปสรรค.....ไม่

มี

ข้อเสนอแนะ.....

ไม่

มี

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานสายไหม (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม (ฝ่ายโยธา)						
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1	โครงการติดตั้งและ/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	46.77	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
2	กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	16.67	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
3	กิจกรรมการแก้ปัญหาจุดจราจรผิด	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	20	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
4	กิจกรรมปรับปรุงทางจักรยาน	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	43.30	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
5	กิจกรรมปรับปรุงทางเท้า	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	0	6,848,000	6,734,740
6	กิจกรรมขุดลอกท่อ/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	แล้วเสร็จ	100	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
7	กิจกรรมแก้ไขจุดเสียงน้ำท่วม	ตุลาคม 2566 –	กำลังดำเนินการ	85	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

		กันยายน 2567				
8	ชุดลอกคลองหมอนสี่สิบ	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	10.04	5,531,000	
9	ชุดลอกคลองหนองยาว	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	แล้วเสร็จ	100	2,871,000	1,150,034.40
10	ชุดลอกคลองหนองควายหาย	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	69.73	1,802,000	843,057
11	ชุดลอกคลองออบเป้ง จากคลองจรเข้โพรงถึงคลอง บัวมน	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	แล้วเสร็จ	100	3,346,000	1,249,902.40
12	ปรับปรุงซอยรุ่งเรือง จากถนนเพิ่มสิน ถึงสุดระยะที่ กำหนด	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	0	9,711,000	
13	ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-33 (ซอยหิน อ่อน 3) จากซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4 ถึงสุด ระยะที่กำหนด	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	0	7,071,000	5,303,117
14	ปรับปรุงซอยเพิ่มสิน 43 จากถนนเพิ่มสิน ถึงซอย พหลโยธิน 54/1 แยก 4	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	0	9,294,000	6,780,639
15	ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 52 แยก 11 - 4 ถึงซอย พหลโยธิน 52 แยก 13 (ซอยวัดอมราวา)	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	0	2,896,000	2,519,972

16	ปรับปรุงซอยเพิ่มสิน 21 จากถนนเพิ่มสิน ถึงสุดเขต ทางสาธารณะ	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	0	10,623,000	7,616,550
17	ปรับปรุงซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 50 แยก 1 และซอย จตุโชติ 4 แยก 2-2 จากซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 50 ถึงซอยจตุโชติ 4 แยก 2	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	0	13,654,000	10,348,940.00
18	ปรับปรุงซอยสายไหม 56 จากคลองลำหม้อแตก ถึง ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	0	20,908,000	15,412,900
19	ปรับปรุงซอยเพิ่มสิน 19 จากถนนเพิ่มสิน ถึงคลอง ออเกาะ	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	0	14,526,000	10,937,005
20	ปรับปรุงทางเท้าซอยสายไหม 43 จากถนนสายไหม ถึงสุดระยะที่กำหนด	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	0	6,848,000	

ปัญหาและอุปสรรค.....ไม่มี.....

.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....

.....

.....

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานสายไหม (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)						
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1	โครงการส่งเสริมการตลาดและคัดแยกขยะตามประเภท แหล่งกำเนิด (โครงการส่งเสริมการจัดการมูลฝอย จากแหล่งกำเนิด)	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	แล้วเสร็จ	100	80,000	80,000
2	กิจกรรมการพัฒนาถนนสวย	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	49.50	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
3	กิจกรรมการปลูกต้นไม้ล้านต้น	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	80	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
4	กิจกรรมการเพิ่มสวน 15 นาที	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	33.33	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
5	สัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	75	1,142,800	
6	กิจกรรมการคัดแยกขยะไม่เทรวม	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	42.31	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

7	กิจกรรมการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (%ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	96	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
---	---	----------------------------	----------------	----	----------------	----------------

ปัญหาและอุปสรรค.....ไม่มี

.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี

.....

.....

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานสายไหม (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)						
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1	โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกใน พื้นที่กรุงเทพมหานคร	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	แล้วเสร็จ	100	361,920	
2	โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	79.60	129,600	
3	โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อม และ อาชีวอนามัยที่ดี สะอาด ปลอดภัย	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	85	133,200	

ปัญหาและอุปสรรค.....ไม่มี.....

.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานสายไหม (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)						
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1	โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขต	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	0	1,134,000	
2	โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุอายุและคนพิการ	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	0	865,000	
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน (โครงการครอบครัวรักการอ่าน (บ้านหนังสือ)	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	0	360,000	
4	กิจกรรมการปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	33.33	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
5	กิจกรรมการส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	28.84	13,656,150	3,150,867
6	ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	13.40	13,430,000	13,430,000

7	กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬา	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	แล้วเสร็จ	100	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
8	กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบางข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	แล้วเสร็จ	100	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

ปัญหาและอุปสรรค.....ไม่มี.....
.....
.....
.....

ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....
.....
.....

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานสายไหม (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม (ฝ่ายการศึกษา)						
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1	เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	0	7,362,600	
2	กิจกรรมปรับปรุงโรงเรียนอเงิน (อ่อน-เหม อนุสรณ์)	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	0	499,000.00	
3	กิจกรรมปรับปรุงโรงเรียนสายไหม (ทัศนารมย์- อนุสรณ์)	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	0	3,338,000.00	
4	กิจกรรมปรับปรุงโรงเรียนหนองใหญ่	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	0	1,717,000.00	
5	กิจกรรมปรับปรุงโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	0	785,000.00	
6	กิจกรรมปรับปรุงโรงเรียนประชานุกุล (ข้าสนิท อนุเคราะห์)	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	0	1,012,000.00	
7	กิจกรรมปรับปรุงโรงเรียนชอยแอนเนกซ์	ตุลาคม 2566 –	กำลังดำเนินการ	0	2,481,000.00	

	(กาญจนภิเษก 2)	กันยายน 2567				
8	กิจกรรมปรับปรุงโรงเรียนราชภัฏรณิยมธรรม (พิบูลสงคราม)	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	0	4,058,000.00	
9	กิจกรรมปรับปรุงโรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	0	1,298,000.00	

ปัญหาและอุปสรรค.....ไม่มี.....
.....
.....
.....

ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....
.....
.....

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานสายไหม (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม (ฝ่ายรายได้)						
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	60	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

ปัญหาและอุปสรรค.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานสายไหม (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม (ฝ่ายคลัง)						
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1	การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567	กำลังดำเนินการ	50	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

ปัญหาและอุปสรรค.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....

