



โครงการปรับปรุงซอยเสรีไทย 65

จากปากซอยถึงสุดทางสาธารณะ

แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร



โครงการปรับปรุงซอยเสรีไทย 65

จากปากซอยถึงสุดทางสาธารณะ

แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

สัญญาจ้างเลขที่ : ยธ.2/2566 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
 เริ่มสัญญา : 17 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 16 กรกฎาคม 2566
 ค่าก่อสร้าง : 1,627,500.00 บาท
 ระยะเวลา : 150 วัน



เนื้อหา

1. ขุดลอกผิวทางและสิ่งก่อสร้างเดิมออก พร้อมขนย้ายไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 865 ตร.ม.
2. สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 162 ม.
3. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 18 บ่อ
4. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกคอัดแน่นหนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 830 ตร.ม.
5. สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 6 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 530 ตร.ม.
6. สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 230 ตร.ม.
7. สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 205 ม.
8. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมกับท่อระบายน้ำ ถนนเสรีไทย ฝาดะแกรงเหล็กกลม ตามแบบ มน.-05 จำนวน 2 แห่ง



ผู้รับจ้าง

: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิโรจน์ก่อสร้าง

ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง


: นายธีรเดช มงคลเจริญ วิศวกร
นางสาวณัฐธิดา ณ.มาชัย ผู้ประสานงาน

เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน

: นายชำนาญ เสมอใจ นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายจิรวัฒน์ พันผา นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายวิโรจน์ โพธิ์รอด นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน



ผังบริเวณและแบบแปลน



แผนปฏิบัติการ

ลำดับ	รายละเอียด	ระยะเวลา (วัน)				
		รวม	ณ	นี้	นี้	นี้
1	เตรียมงาน	05	05	05	05	05
2	ขุดลอกผิวทางและสิ่งก่อสร้างเดิมออก พร้อมขนย้ายไปทิ้ง	05	05	05	05	05
3	สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 162 ม.	05	05	05	05	05
4	สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 18 บ่อ	05	05	05	05	05
5	สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกคอัดแน่นหนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 830 ตร.ม.	05	05	05	05	05
6	สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 6 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 530 ตร.ม.	05	05	05	05	05
7	สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 230 ตร.ม.	05	05	05	05	05
8	สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 205 ม.	05	05	05	05	05
9	สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมกับท่อระบายน้ำ ถนนเสรีไทย ฝาดะแกรงเหล็กกลม ตามแบบ มน.-05 จำนวน 2 แห่ง	05	05	05	05	05
10	ทำความสะอาด	05	05	05	05	05



ความคืบหน้าของการดำเนินการก่อสร้าง



สัญญาจ้างเลขที่ ยธ.2/2566 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

เริ่มสัญญา 17 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 16 กรกฎาคม 2566

ค่าก่อสร้าง 1,627,500.00 บาท

ระยะเวลา 150 วัน

เนื้อหา

1. ขุดลอกผิวทางและสิ่งก่อสร้างเดิมออก พร้อมขนย้ายไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 865 ตร.ม.
2. สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 162 ม.
3. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 18 บ่อ
4. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 830 ตร.ม.
5. สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 6 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 530 ตร.ม.
6. สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 230 ตร.ม.
7. สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 205 ม.
8. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมกับท่อระบายน้ำ ถนนเสรีไทย ฝาดะแกรงเหล็กกลม ตามแบบ มน.-05 จำนวน 2 แห่ง

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิโรจน์ก่อสร้าง

ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง

1. นายธีรเดช	มงคลเจริญ	วิศวกร
2. นางสาวณัฐธิดา	ณ.มหาชัย	ผู้ประสานงาน โทร. 081-989-6777

เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน


1. นายชำนาญ	เสมอใจ	นายช่างโยธาชำนาญงาน
-------------	--------	---------------------

ฝ่ายโยธา 02-379-9943

2. นายจิรวินน์	พินผา	นายช่างโยธาชำนาญงาน
3. นายวิโรจน์	โพธิ์รอด	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

พิกัดจุดก่อสร้าง 13.792878184466243, 100.68450842586958

ผังบริเวณ และแบบแปลน

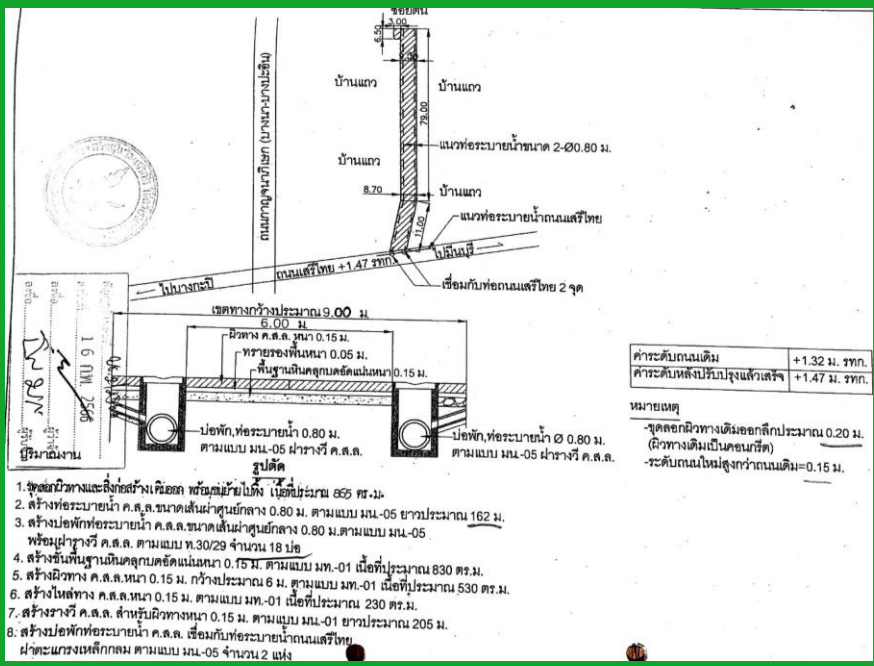

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายโยธา โทร.๕๑๖๓
 ที่ กท.๕๐๐๒/๕๕๕ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
 เรื่อง แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานจ้างปรับปรุงซอยเสวีย์ไทย ๖๕ จากปากซอย
 ถึงผู้ทรงคุณวุฒิ
 เรียน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน

ตามหนังสือคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ ๒๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง
 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
 สำหรับงานประกวดราคาจ้างปรับปรุงซอยเสวีย์ไทย ๖๕ จากปากซอยถึงผู้ทรงคุณวุฒิ โดยวิธีประกวดราคา
 อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งจากการพิจารณาอนุมัติสั่งจ้างทั้งในส่วนจำกัด โครโครจน์ก่อสร้าง เป็นผู้ชนะการ
 เสนอราคาดังกล่าว ตามหนังสือที่ กท.๕๐๐๓/๕๑๐๕ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตคันนายาว ได้ทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด โครโครจน์ก่อสร้าง
 ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ยธ.๒/๕๑๖๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วงเงินค่าจ้างเหมา ๑,๒๒๗,๕๐๐ บาท
 (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน ครบกำหนดสัญญา
 วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมนี้ได้แนบหนังสืออนุมัติแต่งตั้ง
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และสัญญาจ้างเลขที่ ยธ.๒/๕๑๖๖ มาด้วยแล้ว

นายสุรวิทย์ ธีระภักดิ์
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 สำนักงานเขตคันนายาว

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทรวณ		
๑. นายพิททรวณ ยุคเพทาย	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ฝ่ายปกครอง	ประธานกรรมการ.....
๒. นายเสริม พลกุล	นายช่างโยธาชำนาญงาน ฝ่ายโยธา	กรรมการ.....
๓. นายอนพอด แก่นทวีชัย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชน	กรรมการ.....
ผู้ควบคุมงาน ทรวณ		
๑. นายวิโรจน์ โพธิ์รอด	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ฝ่ายโยธา	ผู้ควบคุมงาน.....
๒. นายจิรวัฒน์ พันธมา	นายช่างโยธาชำนาญงาน ฝ่ายโยธา	ผู้ควบคุมงาน.....
๓. นายชำนาญ เหมอใจ	นายช่างโยธาชำนาญงาน ฝ่ายโยธา	ผู้ควบคุมงาน.....

รูปภาพก่อนและหลังดำเนินการ

ก่อนดำเนินการ



หลังดำเนินการ



ก่อนดำเนินการ



หลังดำเนินการ



แผนการปฏิบัติงาน

แผนการดำเนินงาน ปรับปรุงซอยเสวีย์ไทย 65 จากปากซอยถึงจุดทางสามแพร่ง
ฝั่งถนนส่วนใต้ถล ไซทรีโรจนก่อสร้าง

ลำดับ	รายการปรับปรุง	จำนวน	หน่วย	ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน				
				30	60	90	120	150
1	เดซีตงาน							
2	ขุดลอกคูคลองหรือก่อสร้างคันดินออก หรือขนถ่ายไปทิ้งเมื่อที่ประมาณ	865	ตร.ม.					
3	สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ราวประมาณ	162	ม.					
4	สร้างบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 หรือมีวางวี ค.ส.ล. ตามแบบ	18	บ่อ					
5	สร้างชั้นหินลูกรังอัดแน่นหนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เมื่อที่ประมาณ	830	ตร.ม.					
6	สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ผิวประมาณ 6 ม. ตามแบบ มท.-01 เมื่อที่ประมาณ	530	ตร.ม.					
7	สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เมื่อที่ประมาณ	230	ตร.ม.					
8	สร้างวางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ราวประมาณ	205	ม.					
9	สร้างบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมกับที่ระบายน้ำถนนเสวีย์ไทย ลาดกระบังอีก ตามแบบ มน.-05 จำนวน	2	บ่อ					
10	เก็บงานและทำความสะอาด							



ลงชื่อ
(นายธีรเดช มงคลเจริญ)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

ความคืบหน้าของการดำเนินการก่อสร้าง 100 %
